

中之島図書館書庫棟改築その他工事の状況について

<経緯>

中之島図書館の耐震補強工事を順次実施。


1. 平成 25 年 3 月末～平成 26 年 12 月 本館及び左右両翼棟（重要文化財部分）の耐震補強工事
2. 平成 27 年 1 月～平成 28 年 3 月 本館及び左右両翼棟（重要文化財部分）の環境改善化工事及び外観美装
3. 平成 28 年度～ 中之島図書館の 2 号書庫・3 号書庫、事務棟等（非重要文化財部分）の耐震補強工事計画

既存建物の耐震補強工事を検討していたが、建築物寿命の延伸効果が望めないこと、補強工事により庫内面積の縮小し収蔵能力が低下するという課題があり、書庫棟を改築することとなった。併せて新書庫棟側の入り口にエレベータを設置、入退館時のバリアフリー化を講じることで利用者の便宜を図ることとした。なお、事務棟、電気棟についても、高額な耐震工事費が必要となることからそれぞれの機能を別館及び新書庫棟に移転した上で、順次撤去することとなった。

4. 令和 2 年度 実施設計。2 号書庫・3 号書庫内資料を外部書庫（旧府立高等学校校舎）並びに中央図書館へ移転。

※外部書庫；約 50 万冊（古典籍資料含む） 中央図書館；約 14, 000 冊

<スケジュール> 令和 3 年 6 月現在

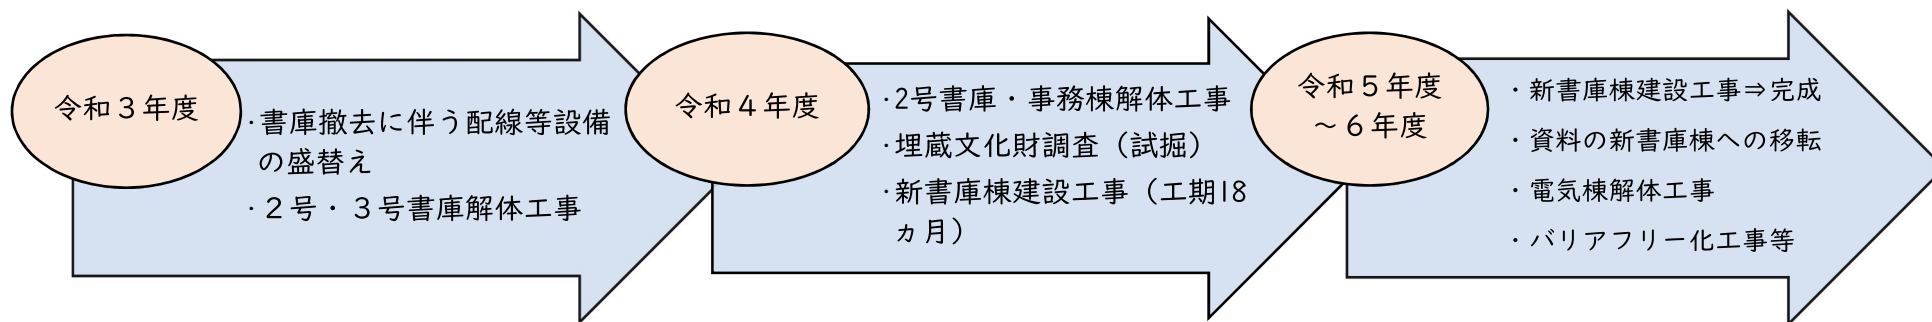

※埋蔵文化財調査（試掘）の結果、文化財が見つかった場合は、調査のため新書庫棟建設工事のスケジュールは9ヵ月先送りとなる。

<外部書庫内資料の提供>

中之島図書館と外部書庫との定期的な図書搬送便を確保。週 3 回。5 月 17 日より開始。
